S3.07 Analyse et Gestion:

Objet : Dossier de Gestion, compte rendu des 5 premières séances

Auteurs : SABRI Zakaria, MELISSE Jean-Paul, LABLEIGNE Thomas, GITTON Camille, ZAHED Mahdiullah, BOULANGER Axel

Groupe n°3 : S3B International

Année Universitaire : 2026/2027

Date : Lundi 12 Octobre 2026

Sous la direction de : Mme Christine UNY

S3.07 Analyse et Gestion:.....1
Équipe.....3
I.1 Première itération : démarche, jeux, difficultés, bénéfices.....3
Démarche.....3
Jeux utilisés.....4
Difficultés rencontrées.....5
Bénéfices de la démarche.....5
I.2 Prototypes de la première itération.....5
Personas.....5
Parcours client.....7
Parcours utilisateur du déménageur.....8
Première description de la solution.....8
II.1 Deuxième itération : démarche, jeux, difficultés.....9
Difficultés rencontrées.....10
II.2 Versions finales des livrables.....10
Personas et parcours associés.....10
BPMN : le parcours de Mme Keller avec l'outil.....10
La solution.....11
Maquettes d'écran.....11
III. Organisation pour la suite du projet.....12
Qui fait quoi quand.....13
Étapes de coordination.....14

Ce compte rendu retrace le travail des cinq premières séances de la SAÉ S3.07 pour Legas Déménagements : comprendre le besoin, modéliser les utilisateurs, prototyper l'outil et organiser la suite.

L'entreprise veut offrir à ses clients publics (lycées, universités…) un outil pour inventorier le mobilier, simuler son implantation et indiquer aux déménageurs « quel objet va où ». Nos sources sont les interviews de Douglas Loustau (déménageur) et de Tina Keller (cliente, université de Bordeaux), et le schéma de processus fourni en annexe.

ÉQUIPE:

Membre	Rôle dans ce document
Jean-Paul	Coordonnée les tâches à faire
Camille	Parcours client
Mahdi	Persona de M. Legas, maquettes d'écran
Axel	Les personas et le parcour utilisateur pour le déménageur
Zakaria	Gestion des différentes ressources et du rendu
Thomas	BPMN

I.1 Première itération : démarche, jeux, difficultés, bénéfices

La première itération suit le processus en cinq étapes du design thinking vu en cours : immersion et empathie, analyse, idéation, prototypage, implémentation, avec un fil rouge : tester et apprendre. Elle couvre les quatre premières étapes ; l'implémentation vient plus tard, après les retours sur nos prototypes.

Démarche

1. ***Immersion et empathie*** (séance 1, 28/09) : rassembler, explorer et approfondir les informations recueillies, en écoutant le client et l'utilisateur sans a priori. Nous avons lu le sujet et le schéma de processus (les étapes concernées par l'outil sont inventorier le mobilier, réaliser les plans d'implantation, étiqueter, imprimer et afficher les plans), relu les interviews de M. Loustau et de Mme Keller, puis joué deux jeux d'empathie : la carte d'empathie, une par acteur, et « dessiner le problème » de Mme Keller.
2. ***Analyse*** (séance 3) : créer des personas, définir les points clés et un besoin par type d'utilisateur. Cette étape a produit des rendus : trois personas (M. Legas, Mme Keller, M. Loustau), issus des cartes d'empathie, puis un parcours client avec courbe de tension et un parcours utilisateur du déménageur, issus du dessin du problème, qui ont servi à concevoir les maquettes.
3. ***Idéation*** : générer des idées pour répondre au besoin, puis les sélectionner. Nous avons retenu une pièce de départ par défaut, une pièce de destination, des meubles décrits par leurs dimensions, couleur, quantité, type, état et caractère fragile, et une fin d'inventaire par salle ou par quantité.
4. ***Prototypage*** (séance 4) : aller du plus simple au plus abouti, d'abord un croquis papier du problème et de la solution, puis des maquettes d'écran sur Excalidraw.
5. ***Tester et apprendre*** : ces prototypes sont présentés en séance 3 (30/09) pour recueillir les retours du chargé de TD ; ils ouvrent la deuxième itération.

Jeux utilisés:

Jeu	Quoi	Pourquoi	Comment
Carte d'empathie	Une fiche en six zones : il pense et ressent, il entend, il voit, il dit et fait, ses problèmes, ses besoins	Se mettre à la place de chaque acteur avant d'analyser	Une carte par acteur (M. Legas, M. Loustau, Mme Keller, personnel de l'établissement), remplie à partir des interviews et du processus. Elle nous a permis d'écrire les personas.
Dessiner le problème	Un schéma qui montre le problème de Mme Keller, puis sa solution	Rendre le problème visible et partagé avant de chercher des solutions	Dessiner d'abord le problème, puis la solution. Il nous a permis de construire le parcours client et le parcours utilisateur, utiles pour concevoir les maquettes.

Nous avons joué deux jeux, tous deux dans la phase d'immersion et d'empathie. Les personas et les parcours ne sont pas des jeux mais des rendus : la carte d'empathie nous a permis de faire les personas, et « dessiner le problème » de faire le parcours client et le parcours utilisateur, qui ont servi à concevoir les maquettes. Le troisième jeu proposé, l'atomisation, n'a pas été utilisé.

Difficultés rencontrées:

- ***Comprendre la consigne*** : au début, nous avons mélangé ce qui relève du parcours client et ce qui relève de la maquette.
- ***M. Legas n'a pas été interviewé directement*** : son persona repose sur des hypothèses tirées des autres interviews.
- ***La charge du travail initialement mal répartie*** : absence d'organisation et de leader.

Bénéfices de la démarche:


- Une vision commune des utilisateurs : les trois personas reprennent la même frustration, les allers-retours causés par un mauvais étiquetage ou de mauvais plans.
- Les deux pics de tension du parcours client (inventaire, puis répartition des meubles dans le nouveau bâtiment) orientent les priorités de l'outil.
- Les maquettes rendent concrètes les questions à poser au client, par exemple les droits par profil (inventaire, implantation, étiquetage).


I.2 Prototypes de la première itération :


La première itération a produit trois personas, deux parcours (client et déménageur) et une première description de la solution.

Personas:

M. Legas est le seul persona fondé en partie sur des hypothèses (il n'a pas été interviewé) ; la case « À valider avec lui » porte la question ouverte du projet.

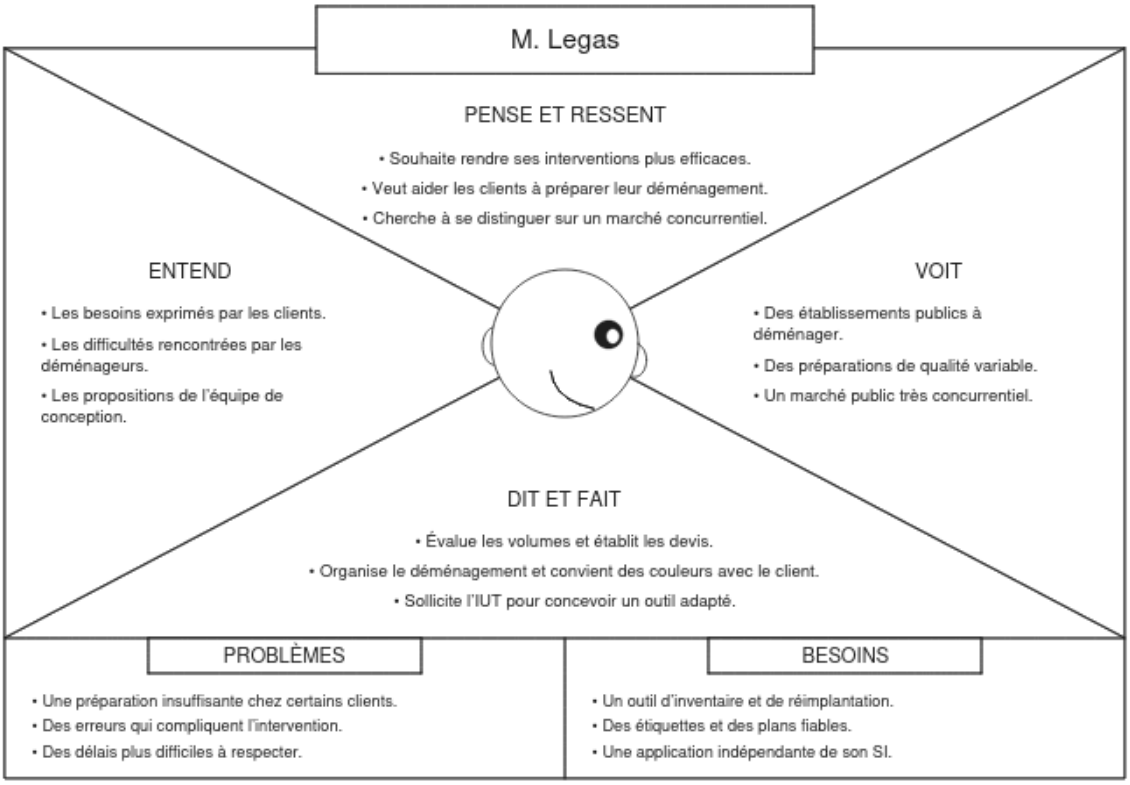


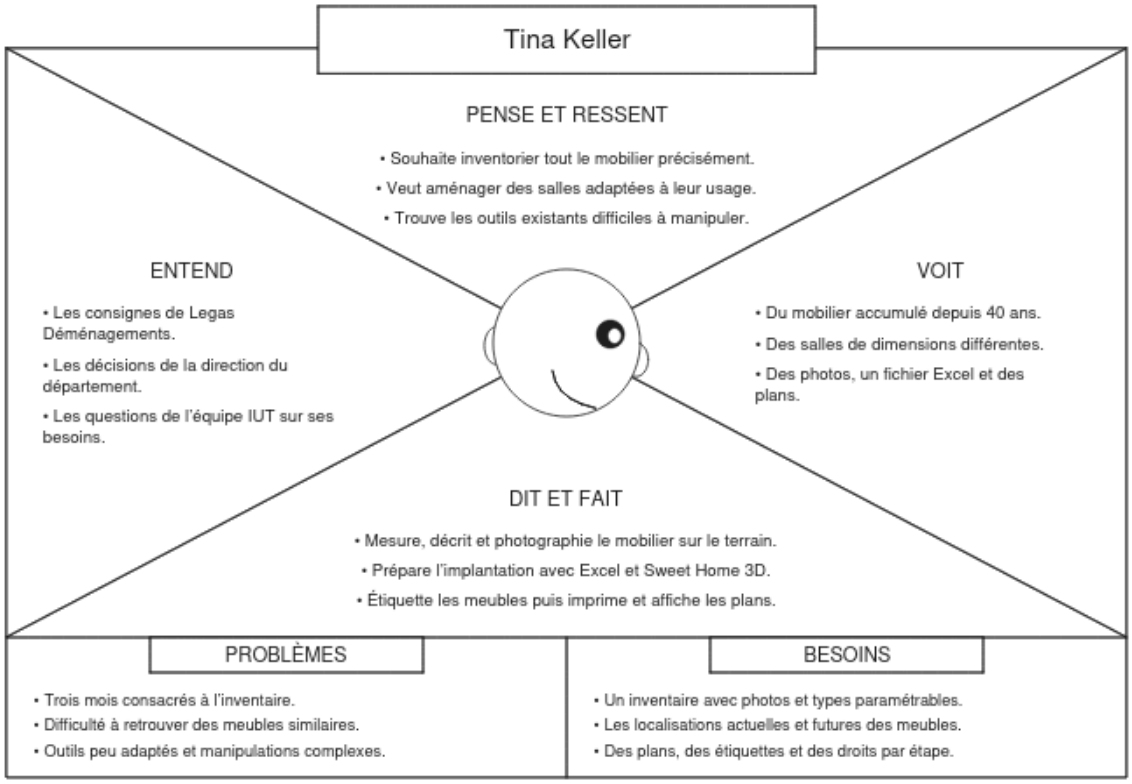
Tina Keller
PENSE ET RESSENT
• Souhaite inventorier tout le mobilier précisément.
• Veut aménager des salles adaptées à leur usage.
• Trouve les outils existants difficiles à manipuler.
ENTEND
• Les consignes de Legas Déménagements.
• Les décisions de la direction du département.
• Les questions de l'équipe IUT sur ses besoins.
VOIT
• Du mobilier accumulé depuis 40 ans.
• Des salles de dimensions différentes.
• Des photos, un fichier Excel et des plans.
DIT ET FAIT
• Mesure, décrit et photographie le mobilier sur le terrain.
• Prépare l'implantation avec Excel et Sweet Home 3D.
• Étiquette les meubles puis imprime et affiche les plans.
PROBLÈMES
• Trois mois consacrés à l'inventaire.
• Difficulté à retrouver des meubles similaires.
• Outils peu adaptés et manipulations complexes.
BESOINS
• Un inventaire avec photos et types paramétrables.
• Les localisations actuelles et futures des meubles.
• Des plans, des étiquettes et des droits par étape.

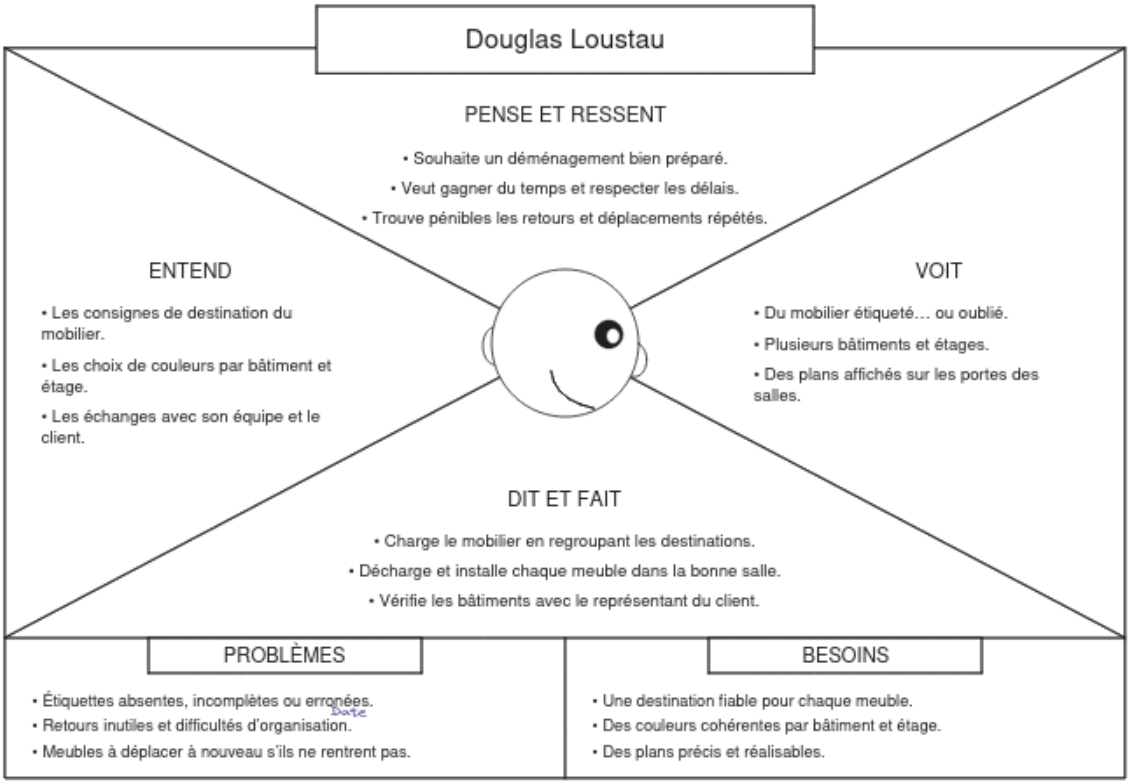
Douglas Loustau
PENSE ET RESSENT
• Souhaite un déménagement bien préparé.
• Veut gagner du temps et respecter les délais.
• Trouve pénibles les retours et déplacements répétés.
ENTEND
• Les consignes de destination du mobilier.
• Les choix de couleurs par bâtiment et étage.
• Les échanges avec son équipe et le client.
VOIT
• Du mobilier étiqueté… ou oublié.
• Plusieurs bâtiments et étages.
• Des plans affichés sur les portes des salles.
DIT ET FAIT
• Charge le mobilier en regroupant les destinations.
• Décharge et installe chaque meuble dans la bonne salle.
• Vérifie les bâtiments avec le représentant du client.
PROBLÈMES
• Étiquettes absentes, incomplètes ou erronées.
• Retours inutiles et difficultés d'organisation.
• Meubles à déplacer à nouveau s'ils ne rentrent pas.
BESOINS
• Une destination fiable pour chaque meuble.
• Des couleurs cohérentes par bâtiment et étage.
• Des plans précis et réalisables.


Parcours client:

Le parcours suit le client en 7 étapes. Deux moments sont les plus tendus : faire l'inventaire, puis répartir correctement les meubles dans le nouveau bâtiment. La prise de contact est l'étape la plus sereine.

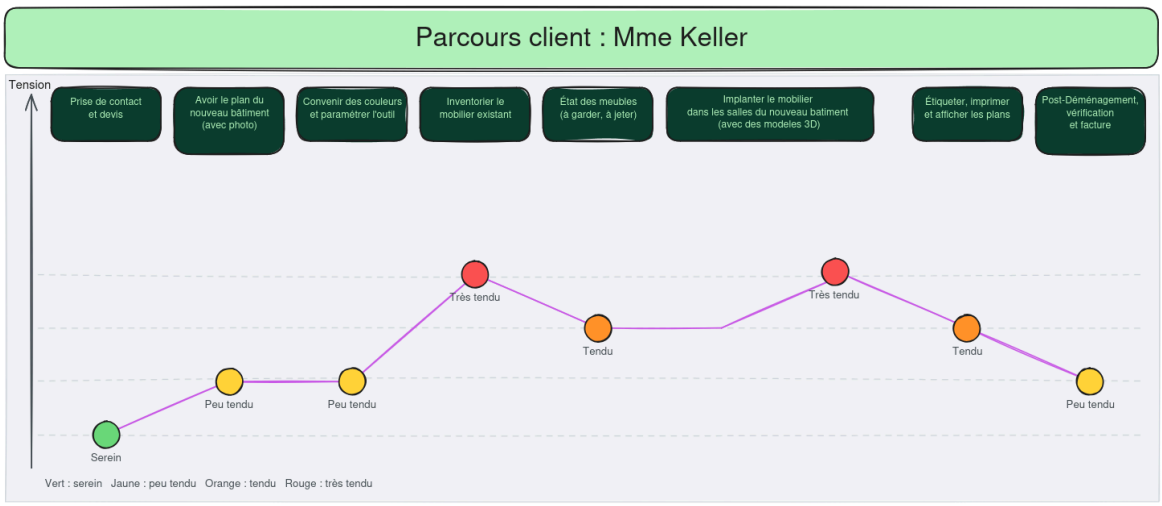


Parcours utilisateur du déménageur:

Le parcours de M. Loustau montre que le ressenti baisse quand les étiquettes ou les destinations sont fausses, et que la fin du déménagement est le moment le plus frustrant.

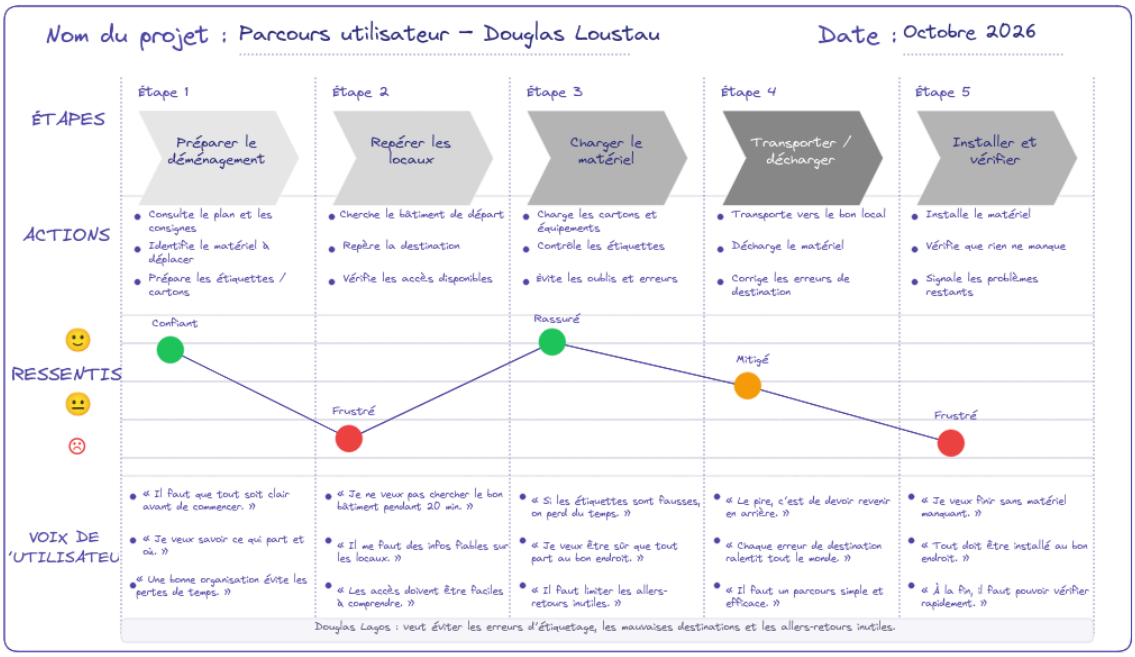

Première description de la solution:

Nous avons formulé le problème de Mme Keller, puis décrit trois objets : la pièce de départ, la pièce de destination et les meubles. Le croquis en bas du schéma pose la logique d'inventaire : une salle est un rectangle fixe, on place chaque meuble à des coordonnées, et l'outil doit signaler une surface déjà occupée.

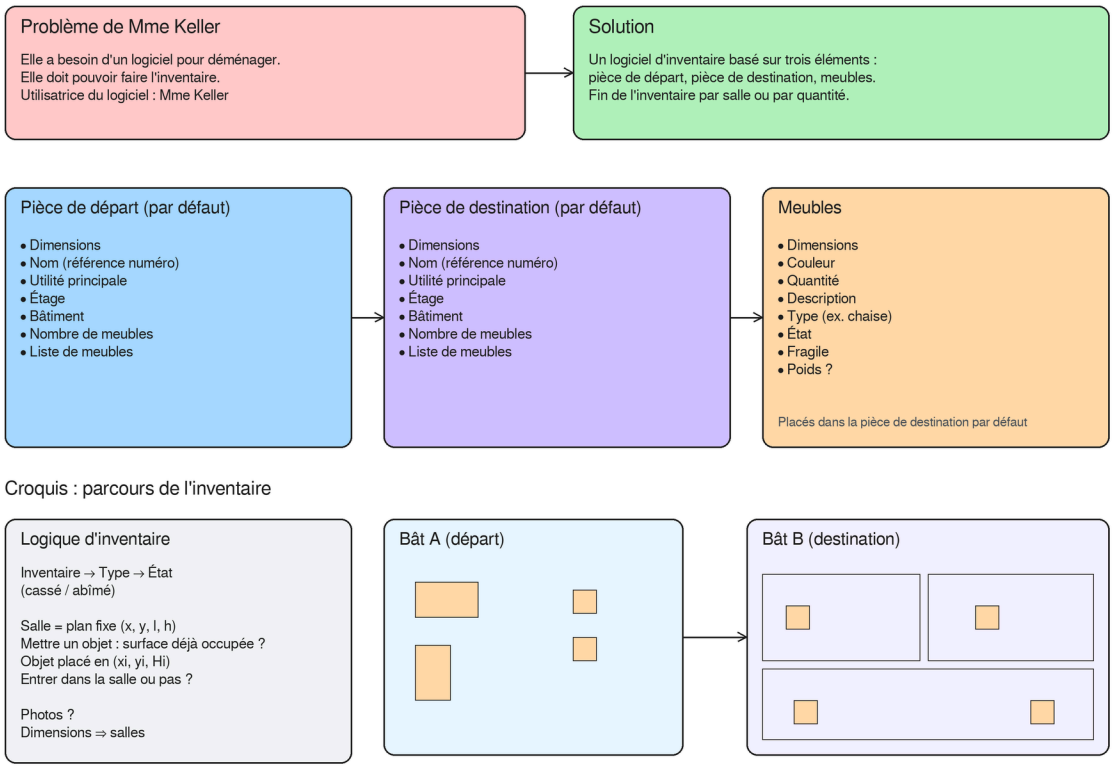

II.1 Deuxième itération : démarche, jeux, difficultés

La deuxième itération a commencé par phase d'écoute, puis par un ajustement de l'analyse. Cette itération nous a servi à améliorer les prototypes. Nous avons corrigé les écarts de la première itération et avons ajouté le BPMN, qui relie chaque persona à un parcours.

Rendu	***Quoi***	***Pourquoi***	**Comment**
BPMN à deux piscines	Un modèle de processus qui montre qui fait quoi entre le client et l'entreprise	Voir où l'outil intervient et ce qui reste hors outil	Partir du processus en annexe, garder les étapes concernées, colorer en orange les tâches réalisées dans l'outil, relier les piscines par des échanges de messages
Association persona et parcours	Un tableau qui dit quel persona a quel parcours	Éviter un BPMN par persona quand certains n'utilisent pas l'application	Pour chaque persona, se demander s'il saisit ou consulte des données dans l'outil
Maquettes itérées	Les écrans de la première version, complétés	Combler les trous repérés dans le BPMN	Ajouter un écran par tâche orange qui n'en avait pas

Difficultés rencontrées:

- **Choisir quels personas ont un BPMN** : la consigne parle d'un parcours par persona, mais seuls ceux qui utilisent l'application comptent. Nous avons retenu Mme Keller.
- **Distinguer trois vues** d'une même histoire : le parcours client (ressenti), le BPMN (enchaînement des tâches) et les maquettes (écrans).
- **Outil de dessin** : le BPMN a été dessiné ici comme une image ; il peut être refait dans l'éditeur Heflo si c'est l'outil attendu.

II.2 Versions finales des livrables


Les versions finales sont les trois personas (partie I.2), le BPMN du parcours de Mme Keller, la description de la solution et cinq maquettes d'écran.

Personas et parcours associés:

Persona	***Utilise l'application ?***	***Parcours associé***
Mme Keller, cliente	Oui : paramétrage, inventaire, implantation, étiquetage	Parcours client et BPMN ci-dessous
M. Legas, dirigeant	Non : il convient des couleurs d'étiquettes et planifie	Apparaît dans la piscine Legas du BPMN
M. Loustau, déménageur	Oui : il utilise les étiquettes et plans de l'application.	Parcours utilisateur du déménageur et ligne d'eau des déménageurs


BPMN : le parcours de Mme Keller avec l'outil

Le processus part du devis accepté et se termine au paiement de la facture. Les tâches orangées sont celles que l'outil doit gérer : paramétrer, inventorier, décrire les salles de destination, implanter, étiqueter, imprimer les plans. Si le mobilier ne rentre pas dans une salle, le client revient à l'implantation.

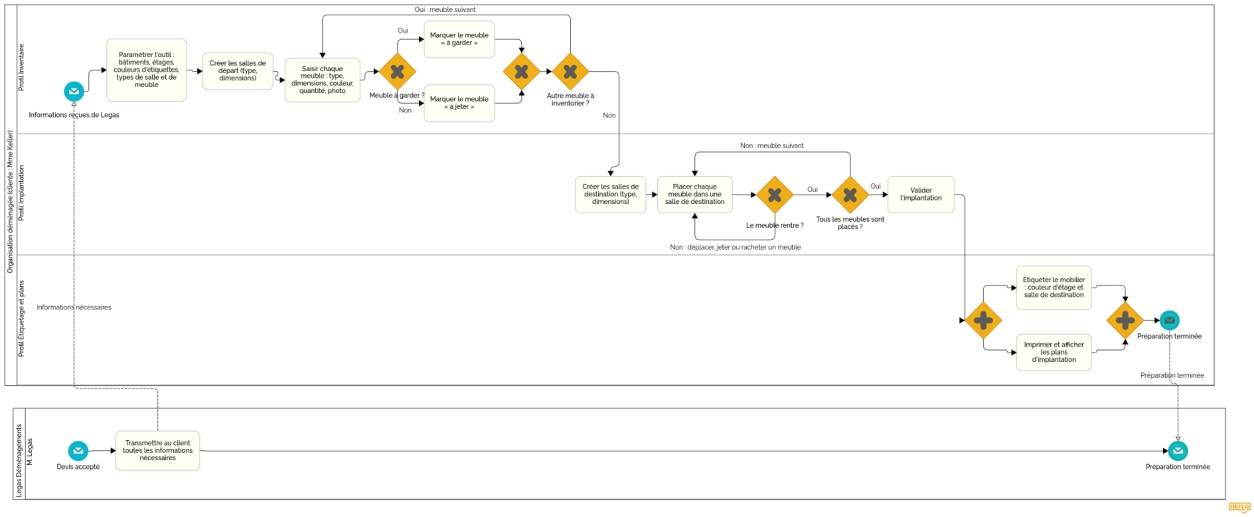


La solution:

L'outil suit quatre étapes : paramétrage, inventaire, implantation, étiquetage et plans. Les droits sont distincts pour les trois dernières, comme le demande Mme Keller. Les types de salle et de mobilier sont paramétrables.

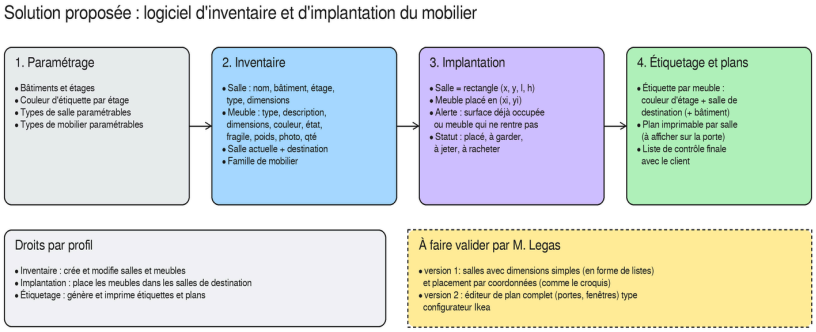

Maquettes d'écran:

Les quatre premiers écrans couvrent la création d'une salle (type, dimensions, départ ou destination), la saisie d'un meuble, la salle de destination avec l'alerte de conflit, et l'étiquette avec le plan imprimable.

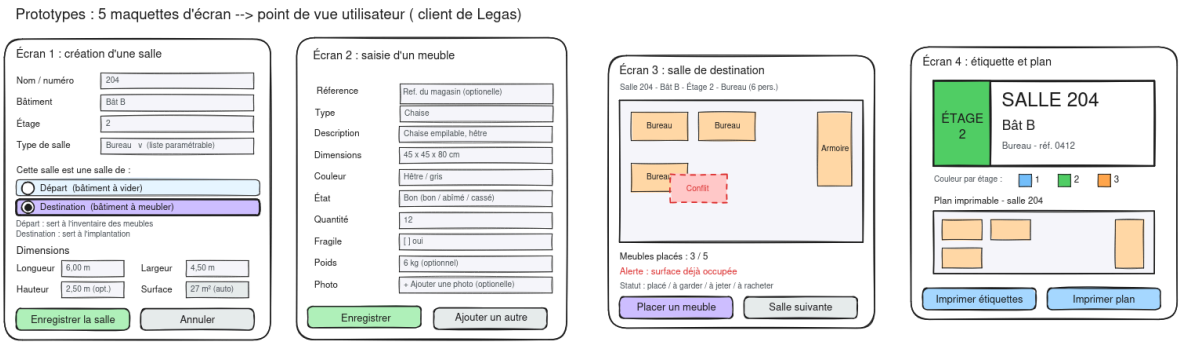

Le cinquième écran liste les meubles déjà inventoriés, par salle ou par quantité. La vue par quantité répond à la difficulté de Mme Keller : repérer des meubles identiques dispersés dans le bâtiment.

Écran 5a : meubles déjà inventoriés (par salle)

Par salle | Par quantité

Rechercher un meuble, une salle...

Meuble	Qté	État
Salle 101 - Bât A - Étage 1 (départ)		
Chaise empilable hêtre/gris	12	Bon
Bureau 140 x 70 hêtre	4	Bon
Armoire haute 2 portes	1	Abîmé
Salle 102 - Bât A - Étage 1 (départ)		
Table de réunion 240 x 100	1	Bon
Chaise visiteur	8	Abîmé
Fauteuil	2	Bon
Salle 103 - Bât A - Étage 2 (départ)		
Caisson mobile	6	Bon
Armoire basse	2	Bon

Total : 36 meubles dans 3 salles

+ Ajouter un meuble | Passer à l'implantation

Écran 5b : meubles déjà inventoriés (par quantité)

Par salle | Par quantité

Rechercher un meuble, une salle...


Meuble	Qté	Salle
Sièges : 22 au total		
Chaise empilable hêtre/gris	12	101
Chaise visiteur	8	102
Fauteuil	2	102
Bureaux et tables : 5 au total		
Bureau 140 x 70 hêtre	4	101
Table de réunion 240 x 100	1	102
Rangements : 9 au total		
Caisson mobile	6	103
Armoire basse	2	103
Armoire haute 2 portes	1	101

Total : 36 meubles - 8 références

+ Ajouter un meuble | Passer à l'implantation

III. Organisation pour la suite du projet:

Les séances d'analyse et conception auront lieu les 13/10 (encadrée puis autonomie), 20/10 (encadrée), 21/10 (autonomie) et 4/11 (autonomie) ; le dossier de conception sera remis le 5/11. L'équipe procède en trois temps : cadrage collectif, production individuelle en parallèle, puis cohérence et intégration collectives. La version préliminaire du diagramme de classes est présentée au chargé de TD le 20/10.

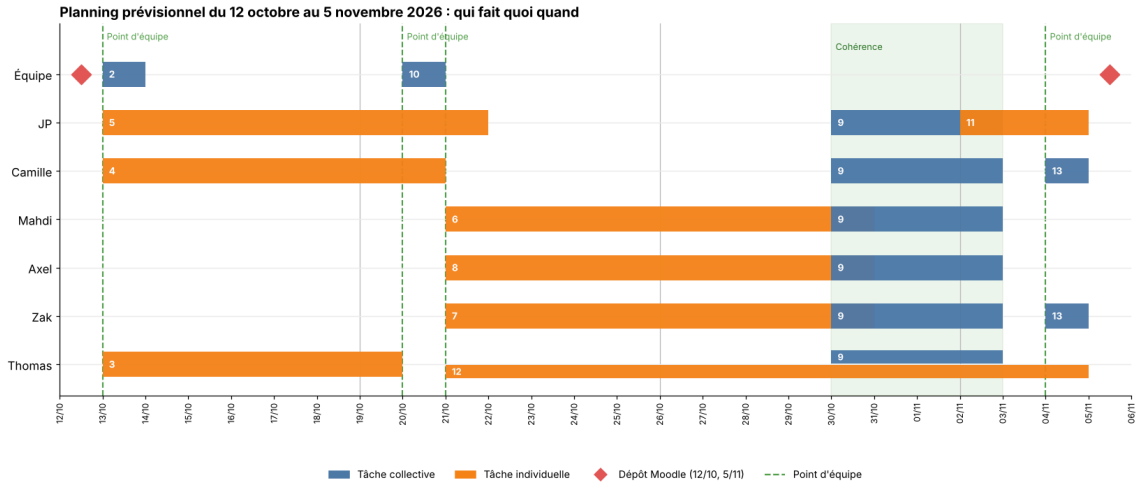

ORGANISATION:

N°	Quand	Qui	Quoi	Livrable
1	12/10	Zakaria	Dépôt du dossier de gestion sur Moodle	Dossier de gestion
2	13/10	Équipe	Atelier de cadrage : lecture de l'exemple Carloc, liste des événements, des acteurs et des cas d'utilisation	Liste des événements et des cas d'utilisation
3	13-19/10	Thomas	Diagramme de contexte statique	Diagramme de contexte statique
4	13-20/10	Camille	Diagramme de classes et responsabilité de chaque classe	Diagramme et texte
5	13-21/10	Jean-Paul	Diagramme de paquets et diagrammes des cas d'utilisation	Paquets et cas d'utilisation
6	21-30/10	Mahdi	Description des cas d'utilisation du paquet Paramétrage et inventaire	Fiches de cas d'utilisation
7	21-30/10	Zakaria	Description des cas d'utilisation du paquet Implantation	Fiches de cas d'utilisation
8	21-30/10	Axel	Description des cas d'utilisation du paquet Étiquetage, plans et droits	Fiches de cas d'utilisation
9	30/10-2/11	Équipe, en binômes	Relecture croisée pour la cohérence : Camille et Jean-Paul, Thomas et Mahdi, Zakaria et Axel	Liste des écarts corrigés
10	20/10	Équipe	Point avec le chargé de TD : version préliminaire du diagramme de classes,	Décision notée

N°	Quand	Qui	Quoi	Livrable
			plans dessinés ou liste de salles	
11	2-4/11	Jean-Paul	Intégration et mise en forme du dossier de conception	Dossier de conception
12	21/10-4/11	Thomas	Bilan de projet : planning prévisionnel contre planning réel, leçons à tirer	Bilan de projet
13	4/11	Camille et Zakaria	Dernières modifications & relecture	Documents relus
14	5/11	Équipe	Dépôt du dossier de conception et du bilan sur Moodle	Dépôt Moodle

Les tâches 3 à 8 sont individuelles et se font en parallèle, mais toutes dépendent de l'atelier de cadrage, et les fiches de cas d'utilisation (6 à 8) dépendent du découpage en paquets (5).

Étapes de coordination:

- ***Atelier de cadrage (13/10, séance encadrée) :*** tout le monde part de la même liste d'événements et de cas d'utilisation, pour synchroniser les compétences avant de se séparer.
- ***Point d'équipe de 15 minutes au début de chaque séance*** (13/10, 20/10, 21/10, 4/11) : avancement, blocages, mise à jour des dates réelles par Thomas.
- ***Relecture croisée (30/10-2/11, à distance) :*** chaque binôme vérifie que classes, contexte et cas d'utilisation se correspondent.
- ***Point avec le chargé de TD (20/10, séance encadrée) :*** présenter le diagramme de classes préliminaire et trancher la question des plans dessinés.
- ***Intégration puis relecture finale (2-4/11) :*** un seul dossier, relu par deux personnes avant le dépôt du 5/11.

S3.07 Analyse et Gestion:

Objet : Dossier de Conception

Auteurs : SABRI Zakaria, MELISSE Jean-Paul, LABLEIGNE Thomas, GITTON Camille, ZAHED Mahdiullah, BOULANGER Axel

Groupe n°3 : S3B International

Année Universitaire : 2026/2027

Date : Jeudi 5 novembre 2026

Sous la direction de : M. Loann GIOVANNANGELI

1. Diagramme de classes

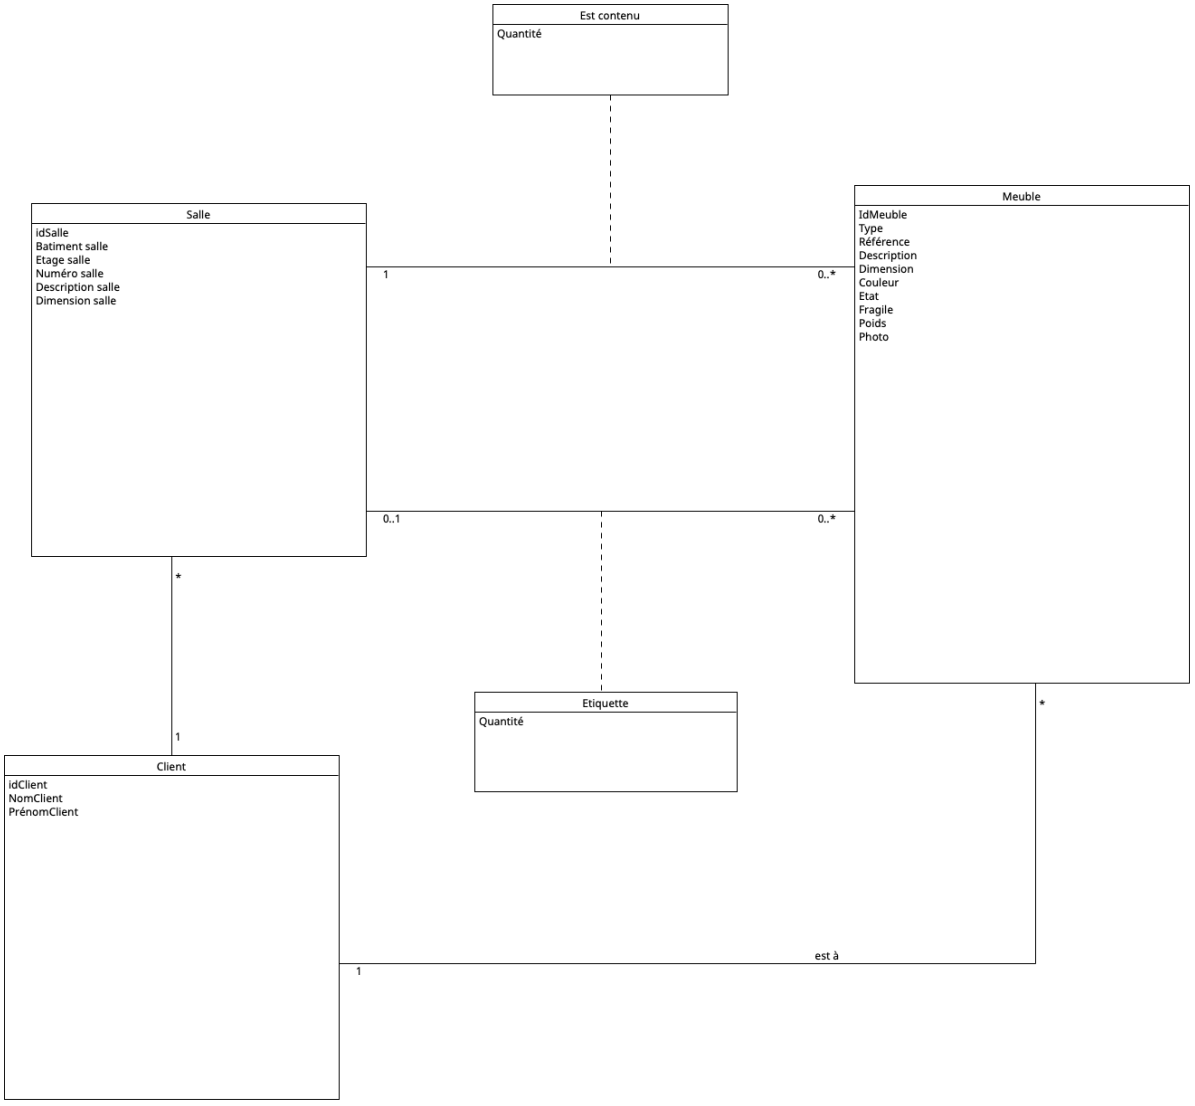


Figure 1 : Diagramme de classes de l'outil de préparation de déménagement

Rôle et responsabilité de chaque classe

Client : représente le pilote du déménagement, c'est-à-dire la personne qui prépare le déménagement de son établissement avec l'outil. Il possède les salles et les meubles de son déménagement : chaque salle et chaque meuble appartient à un seul client.

Salle : représente une pièce d'un bâtiment, du bâtiment de départ ou du bâtiment d'arrivée. Elle est identifiée par son bâtiment, son étage et son numéro, et décrite par une description et ses dimensions. Une salle de départ contient des meubles ; une salle d'arrivée reçoit des meubles lors de l'implantation.

Meuble : représente un meuble inventorié, décrit par son type, sa référence, sa description, ses dimensions, sa couleur, son état, son caractère fragile, son poids et une photo. Ces caractéristiques permettent de retrouver des meubles identiques ou assortis répartis dans plusieurs salles.

Est contenu (classe d'association de « Contient ») : indique combien d'exemplaires d'un meuble se trouvent dans une salle de départ. C'est elle qui porte la quantité saisie lors de l'inventaire.

Étiquette (classe d'association de « Reçoit ») : représente l'affectation d'un meuble à sa salle d'arrivée. Sa quantité indique le nombre d'exemplaires envoyés dans cette salle, donc le nombre d'étiquettes à imprimer. La multiplicité 0..1 signifie qu'un meuble peut ne pas encore être placé, ou ne pas être déménagé s'il est inutilisable.

2. Diagramme de contexte statique

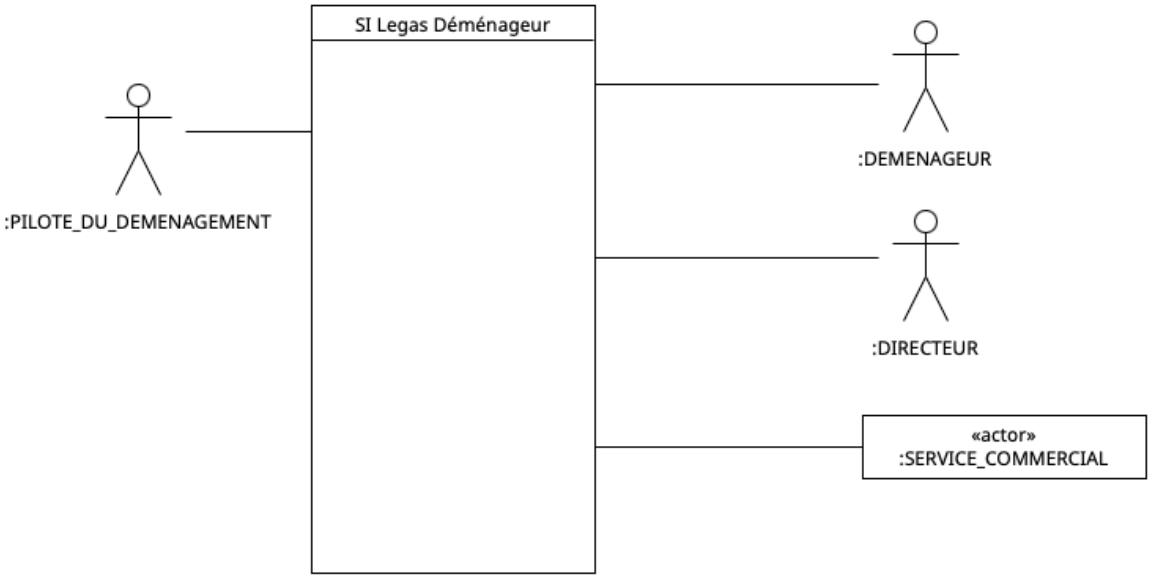


Figure 2 : Diagramme de contexte statique

3. Diagramme de paquets des cas d'utilisation

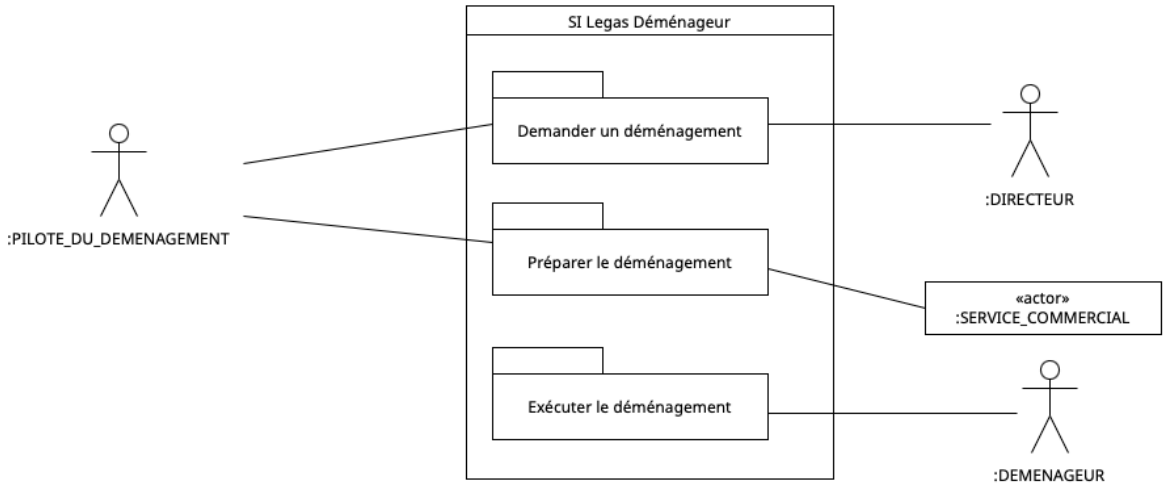


Figure 3 : Diagramme de paquets des cas d'utilisation

4. Diagrammes des cas d'utilisation par paquet

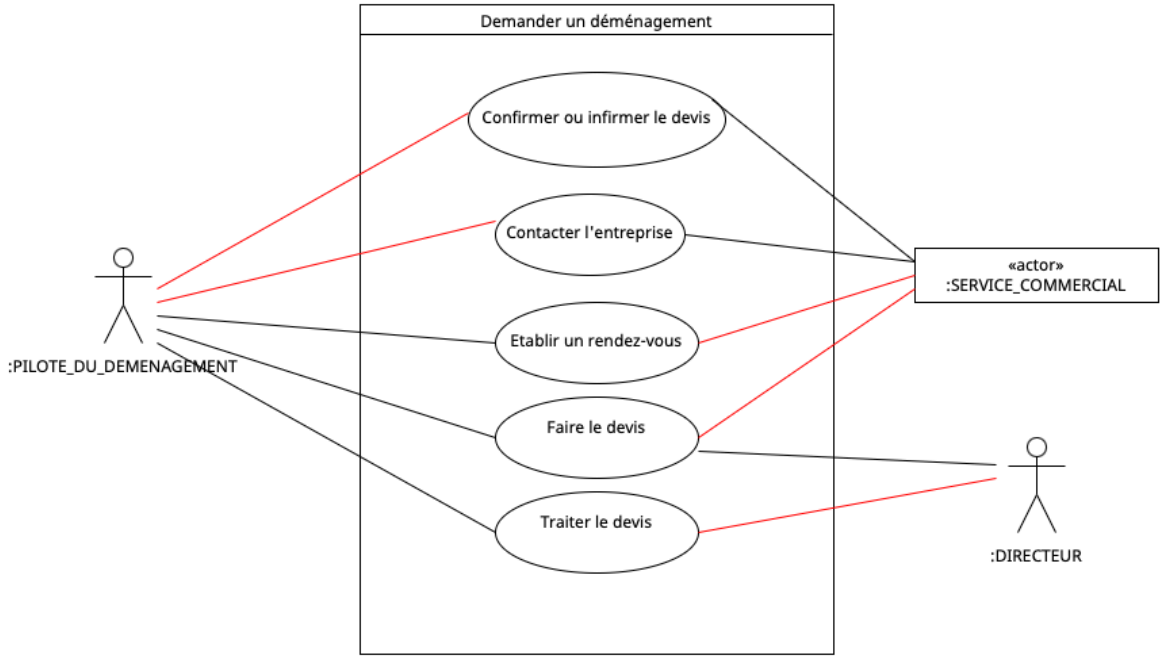


Figure 4 : Diagramme des cas d'utilisation du paquet « Demander un déménagement »

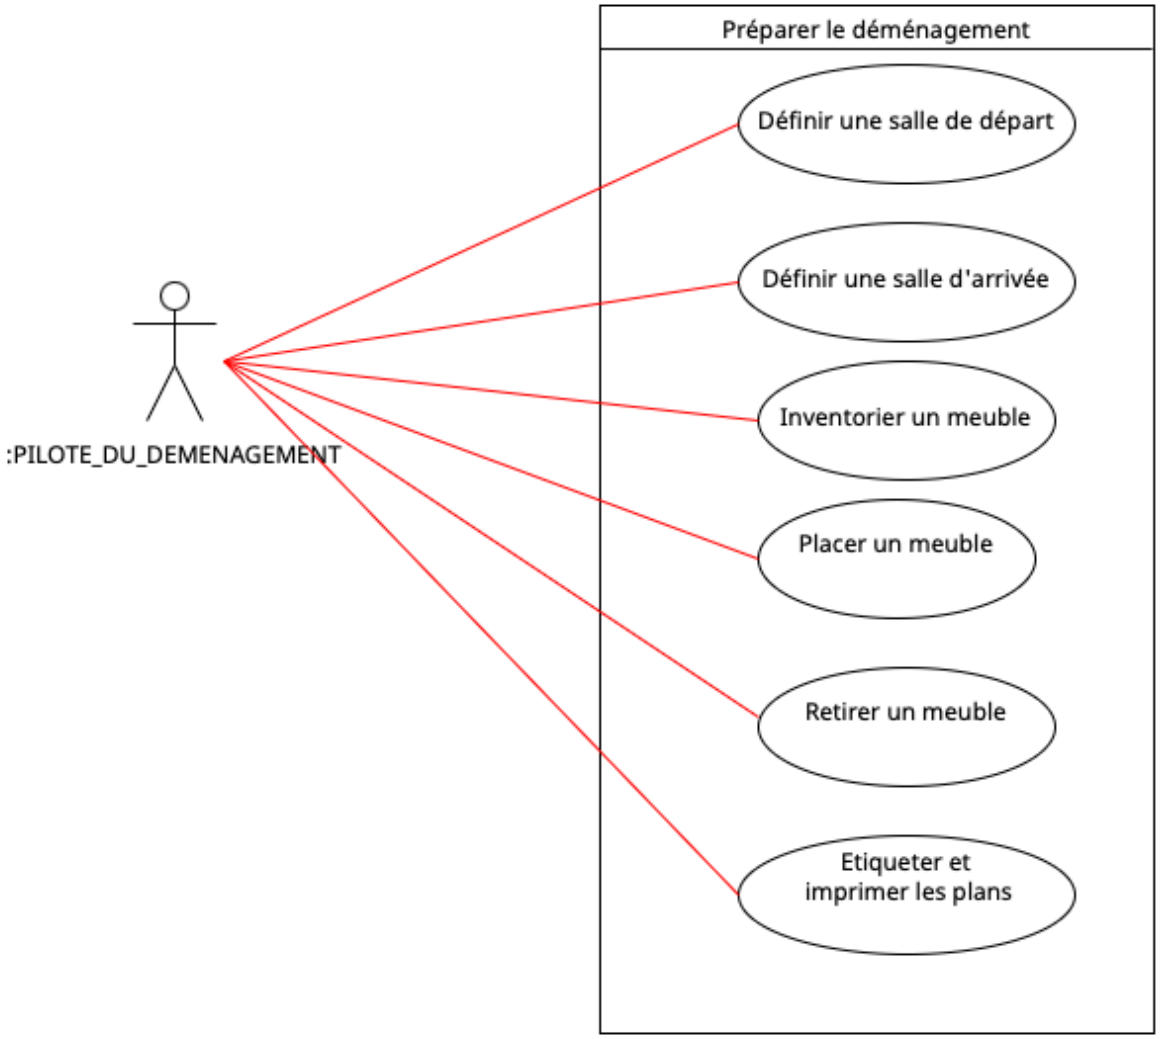


Figure 5 : Diagramme des cas d'utilisation du paquet « Préparer le déménagement »

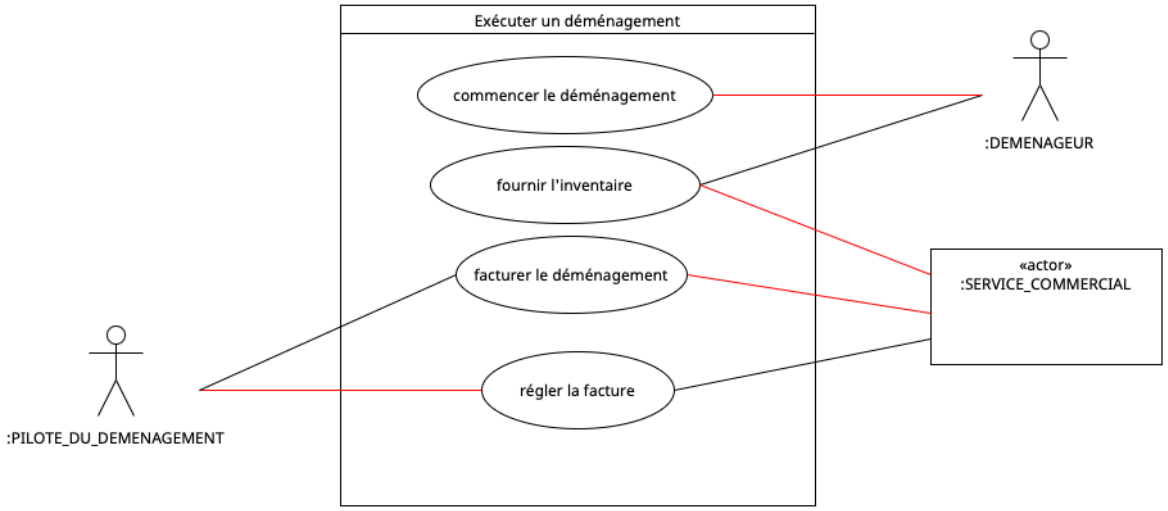


Figure 6 : Diagramme des cas d'utilisation du paquet « Exécuter le déménagement »

5. Description des cas d'utilisation

5.1 Paquet « Demander un déménagement »

Cas d'utilisation « Contacter l'entreprise »

Événement déclencheur : ARR_ContacterEntreprise, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : ENV_ReçoitUnMessage, à destination de :SERVICE_COMMERCIAL.

Scénario nominal : le pilote saisit ses coordonnées et les détails de son projet. Le SI vérifie que les champs obligatoires sont remplis et valides, crée le dossier de déménagement avec l'état « demande reçue », puis notifie le service commercial de la nouvelle demande.

Scénarios alternatifs :

- Des champs obligatoires sont manquants ou invalides (date passée, courriel ou téléphone incorrect) : le SI bloque l'enregistrement et signale les erreurs.
- L'établissement est déjà enregistré : le SI réutilise les coordonnées existantes sans créer de doublon.

Cas d'utilisation « Établir un rendez-vous »

Événement déclencheur : ARR_ÉtablirRendezVous, événement externe produit par l'acteur :SERVICE_COMMERCIAL.

Événements résultats : ENV_ConfirmeRendezVous, à destination de :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Scénario nominal : le service commercial sélectionne le dossier et saisit la date, l'heure et le lieu convenus. Le SI vérifie que le créneau est libre, enregistre le rendez-vous, passe le dossier à l'état « rendez-vous fixé » et transmet la confirmation au pilote.

Scénarios alternatifs :

- Le créneau est déjà occupé ou la date est invalide : le SI refuse la réservation et demande un autre créneau.
- Le dossier n'existe pas ou n'est plus à l'état « demande reçue » : le SI affiche une erreur et refuse la saisie.

Cas d'utilisation « Faire le devis »

Événement déclencheur : ARR_FaireDevis, événement externe produit par l'acteur :SERVICE_COMMERCIAL.

Événements résultats : ENV_EnvoieDevis, à destination de :DIRECTEUR et de :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Scénario nominal : le service commercial saisit les éléments techniques (volume, distance, options). Le SI calcule le montant, génère le devis avec sa durée de validité, passe le dossier à l'état « devis établi » et l'envoie au directeur et au pilote.

Scénarios alternatifs :

- Des informations obligatoires manquent ou aucun rendez-vous n'est enregistré : le SI bloque le calcul et refuse l'édition du devis.
- Un devis existe déjà pour ce dossier : le SI archive la version précédente et génère le nouveau devis en remplacement.

Cas d'utilisation « Traiter le devis »

Événement déclencheur : ARR_TraiterDevis, événement externe produit par l'acteur :DIRECTEUR.

Événements résultats : ENV_EnvoieDevisTraité, à destination de :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Scénario nominal : le directeur examine le devis et le valide. Le SI vérifie que le devis est en attente, enregistre l'approbation, passe le dossier à l'état « devis validé » et transmet le devis validé au pilote.

Scénarios alternatifs :

- Le directeur applique une remise ou une majoration : le SI recalcule le devis, le valide et transmet la version modifiée au pilote.
- Le directeur refuse le devis : le SI clôture le dossier et avertit le pilote et le service commercial.
- Le devis a déjà été traité : le SI bloque l'action et signale qu'un second traitement est impossible.

Cas d'utilisation « Confirmer ou infirmer le devis »

Événement déclencheur : ARR_ConfirmerInfirmerDevis, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : ENV_EnvoieDevisConfirméOuInfirmé, à destination de :SERVICE_COMMERCIAL.

Scénario nominal : le pilote consulte le devis validé et donne son accord. Le SI vérifie que l'offre est toujours valide, enregistre l'acceptation, passe le dossier à l'état « devis confirmé » et notifie le service commercial.

Scénarios alternatifs :

- Le pilote refuse le devis : le SI enregistre le refus, clôture le dossier et en informe le service commercial.
- La durée de validité du devis est dépassée : le SI refuse la confirmation et demande au service commercial de rééditer une proposition.
- Le devis n'a pas encore été validé par le directeur : le SI bloque toute confirmation par le pilote.

5.2 Paquet « Préparer le déménagement »

Cas d'utilisation « Définir une salle de départ »

Événement déclencheur : ARR_DéfinirSalleDépart, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le pilote saisit le bâtiment, l'étage, le numéro, la description et les dimensions d'une salle du bâtiment de départ. Le SI vérifie que les champs obligatoires sont remplis et qu'aucune salle de départ du même client ne porte déjà ce bâtiment, cet étage et ce numéro, crée la salle, la rattache au client et l'ajoute à la liste des salles de départ.

Scénarios alternatifs :

- Une salle de départ avec le même bâtiment, le même étage et le même numéro existe déjà : le SI affiche une erreur et ne crée pas la salle.
- Un champ obligatoire est manquant : le SI affiche une erreur et ne crée pas la salle.

Cas d'utilisation « Définir une salle d'arrivée »

Événement déclencheur : ARR_DéfinirSalleArrivée, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le pilote saisit le bâtiment, l'étage, le numéro, la description et les dimensions d'une salle du bâtiment d'arrivée. Le SI vérifie les champs obligatoires et l'absence de doublon, crée la salle, la rattache au client et l'ajoute à la liste des salles d'arrivée, vide de tout meuble.

Scénarios alternatifs :

- Une salle d'arrivée avec le même bâtiment, le même étage et le même numéro existe déjà : le SI affiche une erreur et ne crée pas la salle.
- Un champ obligatoire est manquant : le SI affiche une erreur et ne crée pas la salle.

Cas d'utilisation « Inventorier un meuble »

Événement déclencheur : ARR_InventorierMeuble, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le pilote choisit une salle de départ et saisit le type, la référence, la description, les dimensions, la couleur, l'état, le caractère fragile, le poids, la photo et la quantité du meuble. Le SI vérifie qu'aucun meuble de même référence n'existe déjà dans cette salle, crée le meuble, enregistre la quantité contenue dans la salle et ajoute le meuble à la liste des meubles à placer.

Scénarios alternatifs :

- Un meuble de même référence existe déjà dans la salle : le SI ne crée pas de nouveau meuble et augmente sa quantité.
- Le meuble est saisi avec l'état « cassé » : le SI l'enregistre, mais l'ajoute à la liste des meubles inutilisables au lieu de la liste des meubles à placer.

Cas d'utilisation « Placer un meuble »

Événement déclencheur : ARR_PlacerMeuble, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le pilote choisit un meuble dans la liste des meubles à placer, une salle d'arrivée et une zone libre de cette salle. Le SI vérifie que la zone n'est pas occupée, enregistre la position du meuble, crée ou met à jour son étiquette pour cette salle en augmentant sa quantité de 1, et diminue de 1 la quantité restant à placer. Si cette quantité atteint 0, le SI retire le meuble de la liste des meubles à placer.

Scénarios alternatifs :

- La zone choisie est déjà occupée par un autre meuble : le SI affiche une erreur et ne modifie ni la position, ni les listes, ni les quantités.
- Les dimensions du meuble dépassent la place disponible dans la salle : le SI affiche une erreur et le meuble reste dans la liste des meubles à placer.

Cas d'utilisation « Retirer un meuble »

Événement déclencheur : ARR_RetirerMeuble, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le pilote sélectionne un meuble placé dans une salle d'arrivée. Le SI libère la zone qu'il occupait, diminue de 1 la quantité de son étiquette pour cette salle, puis augmente de 1 la quantité restant à placer et remet le meuble dans la liste des meubles à placer. Si la quantité de l'étiquette atteint 0, le SI supprime l'affectation du meuble à cette salle.

Scénarios alternatifs :

- Le meuble sélectionné n'est placé dans aucune salle d'arrivée : le SI affiche une erreur et ne modifie rien.

Cas d'utilisation « Étiqueter et imprimer les plans »

Événement déclencheur : ARR_EtiqueterEtImprimerPlans, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : ENV_ÉtiquettesEtPlansImprimés, à destination de :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Scénario nominal : le pilote demande l'édition des étiquettes et des plans. Pour chaque meuble placé, le SI génère une étiquette portant le numéro de la salle d'arrivée, dans la couleur convenue en amont pour son étage, en autant d'exemplaires que la quantité affectée. Il génère ensuite le plan de chaque salle d'arrivée et envoie étiquettes et plans à l'impression.

Scénarios alternatifs :

- Des meubles à déménager ne sont pas encore placés : le SI avertit le pilote, affiche la liste de ces meubles et lui demande de confirmer l'impression.

5.3 Paquet « Exécuter le déménagement »

Cas d'utilisation « Commencer le déménagement »

Événement déclencheur : ARR_CommencerDéménagement, événement externe produit par l'acteur :DEMENAGEUR.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le déménageur démarre la prestation pour la mission demandée. Le SI vérifie que le déménagement est validé, enregistre l'heure de début et passe l'état du déménagement à « en cours ».

Scénarios alternatifs :

- Le déménagement n'est pas encore validé administrativement : le SI bloque le démarrage et affiche une erreur.
- La prestation a déjà été démarrée : le SI signale que la mission est déjà en cours et ne modifie rien.

Cas d'utilisation « Fournir l'inventaire »

Événement déclencheur : ARR_FournirInventaire, événement externe produit par l'acteur :SERVICE_COMMERCIAL.

Événements résultats : ENV_InventaireDisponible, à destination de :DEMENAGEUR.

Scénario nominal : le service commercial transmet l'inventaire complet du dossier client. Le SI vérifie que les informations obligatoires sont présentes, enregistre les éléments et les met à disposition de l'équipe de déménagement.

Scénarios alternatifs :

- Des informations obligatoires sont manquantes ou incorrectes : le SI refuse l'enregistrement et affiche un message d'erreur.

- Un inventaire existe déjà pour cette mission : le SI demande confirmation avant de mettre à jour ou de remplacer les données.

Cas d'utilisation « Facturer le déménagement »

Événement déclencheur : ARR_FacturerDéménagement, événement externe produit par l'acteur :SERVICE_COMMERCIAL.

Événements résultats : ENV_EnvoieFacture, à destination de :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Scénario nominal : le service commercial lance la facturation avec les éléments de tarification et l'identifiant du contrat. Le SI calcule le montant total, édite la facture avec l'état « impayée » et l'adresse au pilote du déménagement.

Scénarios alternatifs :

- Les données réelles (temps ou volume) ne correspondent pas au devis sans justification : le SI bloque la génération automatique de la facture et demande une vérification.
- Une remise ou un geste commercial est appliqué : le SI recalcule les montants et génère la facture mise à jour.

Cas d'utilisation « Régler la facture »

Événement déclencheur : ARR_RéglerFacture, événement externe produit par l'acteur :PILOTE_DU_DEMENAGEMENT.

Événements résultats : aucun.

Scénario nominal : le pilote saisit son moyen de paiement pour la facture correspondante. Le SI fait valider la transaction, enregistre le paiement et passe la facture à l'état « payée ».

Scénarios alternatifs :

- La transaction est refusée par la banque : le SI signale l'échec du règlement et laisse la facture à l'état « impayée ».
- Le paiement ne couvre qu'une partie du montant (acompte) : le SI déduit la somme versée et passe la facture à l'état « paiement partiel ».

6. Conclusion

État d'avancement du projet

Le dossier de conception est complet, il contient le diagramme de classes et le rôle de chaque classe, le diagramme de contexte statique, le diagramme de paquets, un diagramme des cas d'utilisation par paquet et la description de chacun des quinze cas d'utilisation.

La version préliminaire du diagramme de classes a été présentée à M. Loann GIOVANNANGELI le 20 octobre, ses remarques nous ont permis de corriger le diagramme et de revoir le découpage en paquets.

Une relecture croisée a vérifié la cohérence entre les diagrammes, puis le cas « Retirer un meuble » a été ajouté au paquet « Préparer le déménagement ».

Deux besoins exprimés par Mme Keller restent à modéliser plus finement dans une prochaine version : la couleur d'étiquette associée à chaque étage, et des droits distincts pour l'inventaire, l'implantation et l'étiquetage.

Répartition des tâches au sein de l'équipe

Chaque diagramme a été réalisé par un binôme ou un trinôme, avec l'aide des autres membres de l'équipe :

- **Diagramme de classes** : Jean-Paul Melisse et Zakaria Sabri

  -> version préliminaire revue et corrigée avec M. Loann Giovannangeli.

- **Diagramme de contexte statique** : Axel Boulanger et Camille Gitton.
- **Diagramme de paquets** : Thomas Lableigne et Mahdiullah Zahed.
- **Diagrammes des cas d'utilisation** : Zakaria Sabri, Thomas Lableigne et Camille Gitton.
- **Description des cas d'utilisation** : chaque membre de l'équipe a rédigé les scénarios d'une partie des cas d'utilisation.
- **Mise en forme et intégration du dossier** : Zakaria Sabri.

S3.07 Analyse et Gestion:

Objet : Fiche de capitalisation d'expérience

Auteurs : SABRI Zakaria, MELISSE Jean-Paul, LABLEIGNE Thomas, GITTON Camille, ZAHED Mahdiullah, BOULANGER Axel

Groupe n°3 : S3B International

Année Universitaire : 2026/2027

Date : Jeudi 5 novembre 2026

Sous la direction de : Mme Christine UNY

I. Objet de la fiche

Cette fiche effectue le bilan de l'organisation de notre équipe sur la SAÉ S3.07, du 28 septembre au 5 novembre 2026. Elle compare le planning prévisionnel présenté dans le dossier de gestion du 12 octobre au déroulement du projet.

II. Planning prévisionnel et planning réel

Tâche	**Prévu**	**Réel**	**Écart**
Dossier de gestion	Itération 1 en séances 1 et 2, itération 2 en séances 3 et 4, dépôt le 12/10	Rien de présenté en séance 1 ; analyse en séance 3, prototypage en séance 4 ; dépôt le 12/10	Décalage d'une séance, rattrapé
Diagramme de classes	Camille, du 13 au 20/10	Jean-Paul et Zakaria, aidés par l'équipe ; version préliminaire présentée le 20/10 et corrigée	Responsables différents, date tenue
Diagramme de contexte statique	Thomas, du 13 au 19/10	Axel et Camille, aidés par l'équipe	Responsables différents
Diagramme de paquets	Jean-Paul, du 13 au 21/10, découpage Paramétrage et inventaire / Implantation / Étiquetage	Thomas et Mahdiullah ; découpage Demander / Préparer / Exécuter adopté après le point du 20/10	Découpage revu, responsables différents
Diagrammes des cas d'utilisation	Jean-Paul, du 13 au 21/10	Zakaria, Thomas et Camille ; cas « Retirer un meuble » ajouté le 5/11	Responsables différents, correction finale le jour de la remise

Description des cas d'utilisation	Mahdi, Zakaria et Axel, un paquet chacun, du 21 au 30/10	Chaque membre a rédigé une partie des scénarios ; travail presque arrêté pendant les vacances, rattrapé au retour	Retard pendant les vacances
Relecture croisée	En binômes, du 30/10 au 2/11	Réalisée	Aucun
Intégration et mise en forme	Jean-Paul, du 2 au 4/11	Zakaria, terminée le 5/11	Un jour de retard, responsable différent
Dépôt du dossier de conception et du bilan	Équipe, le 5/11	Le 5/11	Aucun

III. Analyse des écarts

Démarrage en retard

Dès la première séance de gestion, nous n'avions rien à présenter à l'enseignante, le travail n'était pas réparti et personne ne coordonnait l'équipe. L'analyse et le prototypage ont donc été décalés d'une séance. Ce retard a été rattrapé et le dossier de gestion a été rendu à temps le 12 octobre, notamment grâce à une prise de responsabilité de l'équipe entière et la désignation de Jean Paul Melisse comme coordinateur du groupe.

Évolution de la répartition des tâches

Notre planning prévoyait un responsable unique par diagramme. En pratique, chaque diagramme a été réalisé par un binôme ou un trinôme, aidé par le reste de l'équipe. Les responsables ont aussi changé, le diagramme de classes, prévu pour Camille, a été fait par Jean-Paul et Zakaria, et le diagramme de contexte statique, prévu pour Thomas, par Axel et Camille. Travailler à plusieurs sur les diagrammes structurants a permis d'avancer plus vite et facilement repérer les erreurs.

Découpage des paquets revu après le point avec le chargé de TD

Notre planning répartissait la description des cas d'utilisation selon trois paquets : « Paramétrage et inventaire », « Implantation » et « Étiquetage ». Après le point du 20 octobre avec M. Giovannangeli, qui a corrigé notre diagramme de classes préliminaire et repris avec nous plusieurs cas d'utilisation, nous avons adopté un autre découpage : « Demander un déménagement », « Préparer le déménagement » et « Exécuter le déménagement ». La répartition des scénarios prévue par paquet ne correspondait plus : chaque membre a finalement rédigé une partie des scénarios.

Arrêt pendant les vacances

Le planning plaçait la rédaction des scénarios, du 21 au 30 octobre, en grande partie pendant les vacances. Le travail s'est presque arrêté pendant cette période. Il a été rattrapé au retour, mais les dernières corrections (l'ajout du cas « Retirer un meuble » au paquet « Préparer le déménagement ») et la mise en forme du dossier ont été terminées la semaine de la remise.

Ce qui s'est déroulé comme prévu

Le diagramme de classes préliminaire a bien été présenté à notre chargé de TD le 20 octobre, et ses remarques ont été intégrées. La relecture croisée en binômes a eu lieu. Les deux dossiers ont été déposés dans les délais.

IV. Nos enseignements pour les prochains projets:

- Désigner un coordinateur et répartir les tâches dès la première séance, pour ne pas commencer un projet avec une séance de retard.
- Faire valider la structure du travail (ici le découpage en paquets) par l'encadrant avant de répartir les tâches qui en dépendent.
- Tenir compte des vacances dans le planning : prévoir qu'aucune tâche importante n'y soit faite, ou la terminer avant.
- Garder au moins une journée de marge avant chaque dépôt pour l'intégration et la mise en forme, qui prennent toujours plus de temps que prévu.
- Continuer à travailler à plusieurs sur les éléments qui structurent tout le projet, comme le diagramme de classes : c'est ce qui a le mieux fonctionné.

V. Conclusion

Malgré un démarrage difficile, un changement de découpage en cours de route et l'arrêt des vacances, l'équipe a rendu tous les livrables dans les délais. Ce projet nous a montré que notre

planning doit être revu à chaque point d'équipe. Notre planning prévisionnel était réaliste sur le contenu, mais pas sur les dates ni sur la répartition. Pour les prochains projet on retient de toujours garder de la marge.
